



Interreg
Polska-Słowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



Projekty parasolowe *Łączy nas natura i kultura* oraz *Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko- słowackim*

**Strešné projekty *pod názvom Spája nás príroda a
kultúra a Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-
slovenskom pohraničí***

Nowy Targ, 15.12.2020





1 oś

Łączy nas natura i kultura / *Spája nás príroda a kultúra*

Partner Wiodący : Związek Euroregion „Tatry”

Partner projektu 1: Samorządowy Kraj Preszowski

Partner projektu 2: Samorządowy Kraj Żyliński

Vedúci partner: Zväzok Euroregión „Tatry”

Partner projektu 1: Prešovský samosprávny kraj

Partner projektu 2: Žilinský samosprávny kraj

Łączy nas natura i kultura / *Spája nás príroda a kultúra*

Okres realizacji:
Obdobie realizácie:

17.02.2016 r. - 30.06.2022 r.

Wartość dofinansowania z EFRR:
*Hodnota finančného príspevku
z EFRR*

7 445 052,46 €

Wartość całkowita projektu:
Celková hodnota projektu:

8 758 885,38 €

IV nabór wniosków o dofinansowanie indywidualnych mikroprojektów - Związek Euroregion „Tatry”/

IV. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutí finančného príspevku na individuálne mikroprojekty – Zväzok Euroregión „Tatry“

15.06.2020 – 07.09.2020

**09.09.2020 -
06.11.2020**

Ocena formalna
Formálne hodnotenie

19-20.11.2020


Ocena jakościowa
Kvalitatívne hodnotenie

17.12.2020

Komitet ds. mikroprojektów
Výbor pre mikroprojekty

IV nabór wniosków - ocena formalna /

IV. výzva na predkladanie žiadostí - formálne hodnotenie

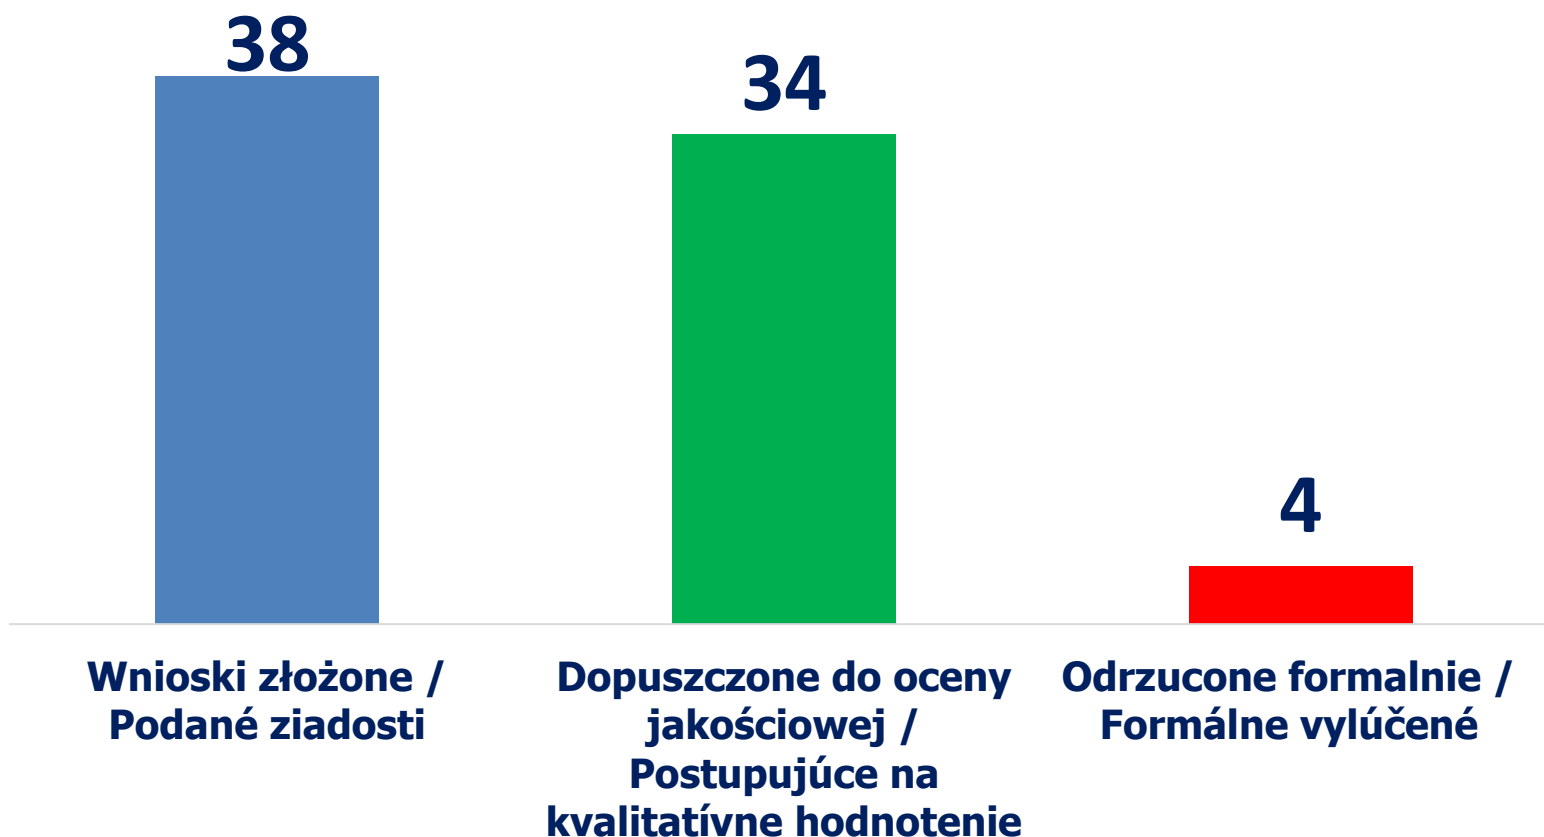


IV nabór wniosków /
IV. výzva na predkladanie žiadostí



568 747,96 €


Alokacja / Alokácia

**Wnioskowane
dofinansowanie**
Žiadaný finančný príspevok



1 617 521,05 €

IV nabór wniosków - ocena jakościowa / *IV. výzva – kvalitatívne hodnotenie*

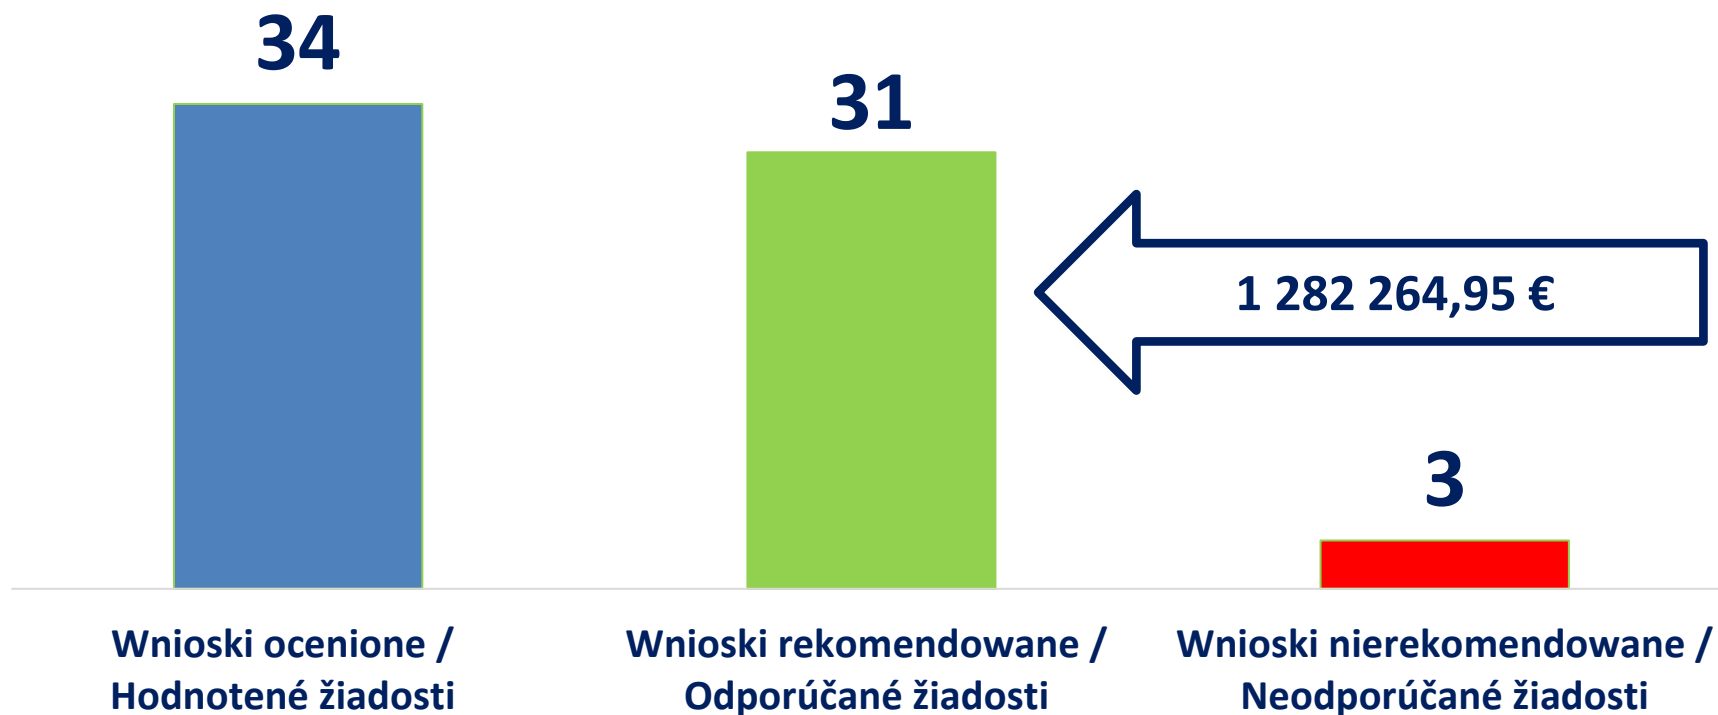

Wykorzystanie alokacji na realizację mikroprojektów / *Využitie alokácie na realizáciu mikroprojektov*

Wartość zakontraktowanych
mikroprojektów po III
naborach

*Hodnota zazmluvnených
mikroprojektov po III.
výzvach*

6 185 907,18 €

Wartość dostępnej alokacji
na mikroprojekty w ramach
PP

*Hodnota dostupnej alokácie
na mikroprojekty v rámci SP*

6 328 294,62 €

97,75 %


1 282 264,95 €



Wartość
mikroprojektów
rekomendowana do
dofinansowania
z IV naboru

*Hodnota
mikroprojektov
odporúčanych do
spolufinancovania
z IV. výzvy*

Wykorzystanie alokacji na realizację mikroprojektów / *Využitie alokácie na realizáciu mikroprojektov*

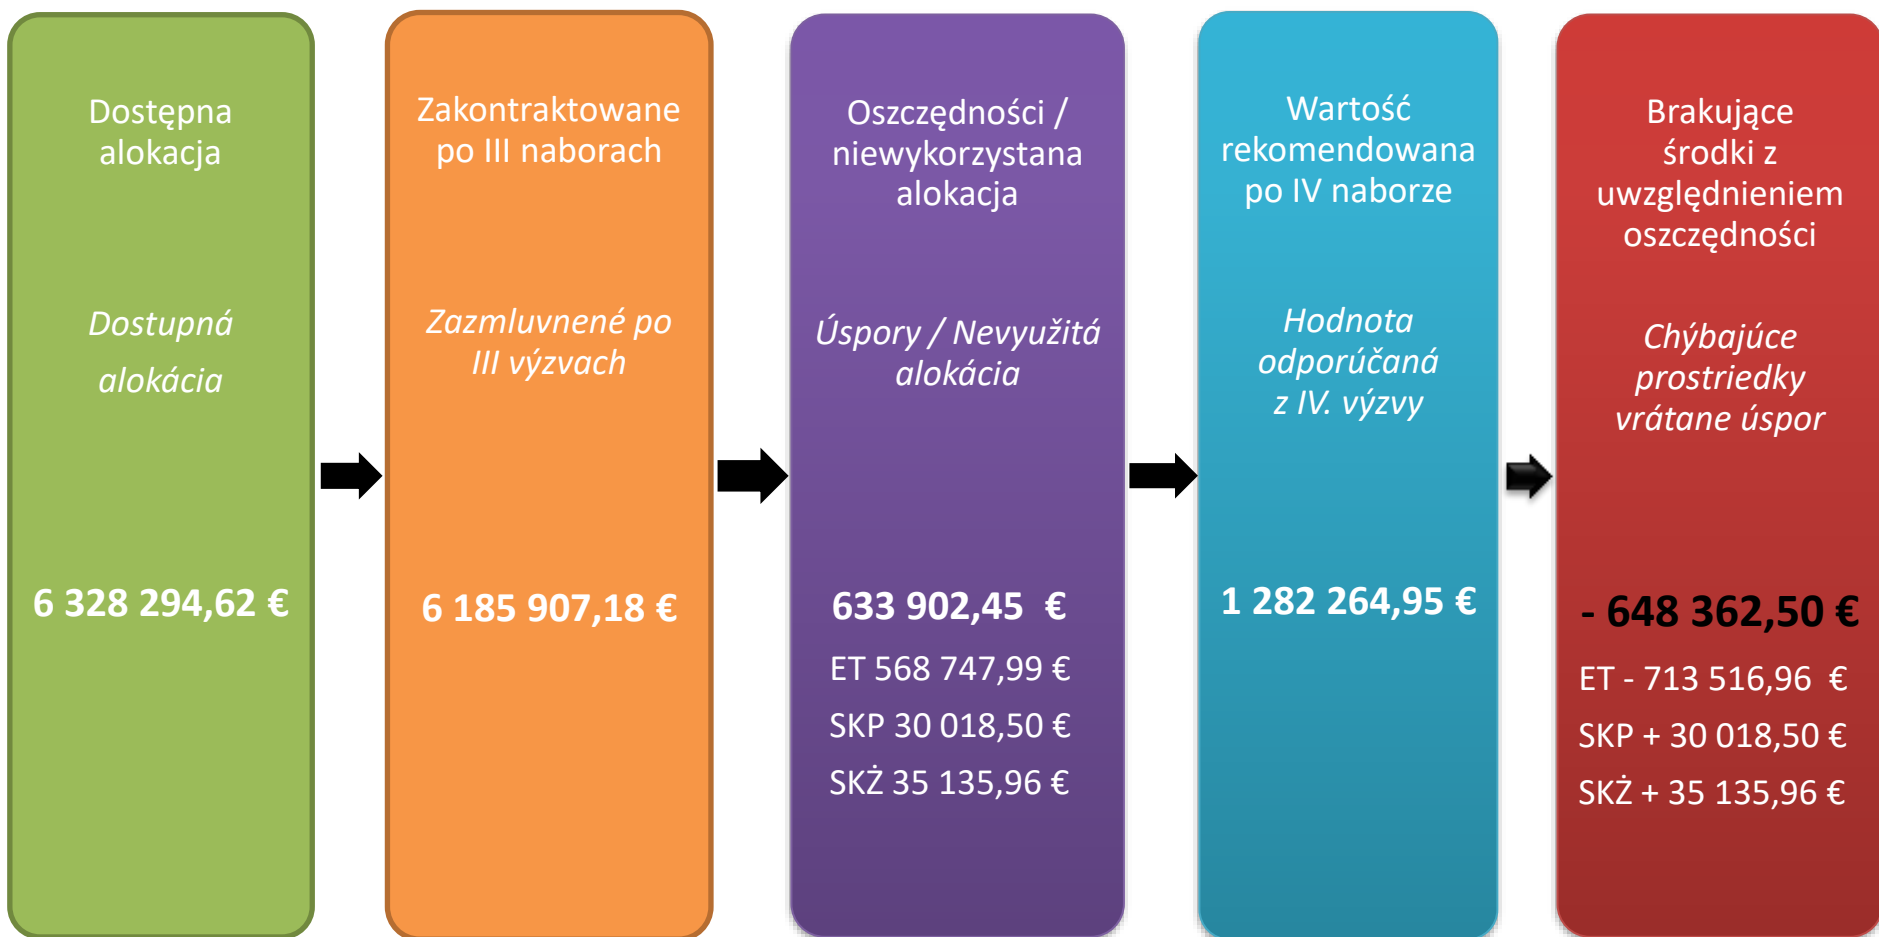

Wnioski o płatność

- 17 wniosek o płatność został złożony do WST 2 grudnia 2020 r.
- Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR:
3 989 011,69 €

Žiadosti o platbu

- *17. žiadost' o platbu bola podaná na STS 2. decembra 2020*
- *Celková hodnota žiadaného spolufinancovania z EFRR:*
3 989 011,69 €


Wskaźniki (po 17 wniosku o płatność)

Ukazovatele (po 17. žiadosti o platbu)

	Nazwa wskaźnika / Názov ukazovateľa	Wartość docelowa / Ciel'ová hodnota	Wartość osiągnięta od początku realizacji/ Hodnota dosiahnutá počas referenčného obdobia	Stopień realizacji/ Stupeň realizácie
1.1	Liczba nowych transgranicznych produktów turystycznych/ <i>Počet nových cezhraničných produktov cestovného ruchu</i>	10	8,5	85 %
1.2	Długość nowych, zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych/ <i>Dĺžka nových, zmodernizovaných alebo zdokonalených cezhraničných turistických chodníkov</i>	338,46	336,43	99,40 %
1.3	Liczba nowych, zmodernizowanych lub rozbudowanych elementów infrastruktury będących częścią transgranicznego produktu/szlaku turystycznego <i>Počet nových/zmodernizovaných/rozšírených prvkov infraštruktúry cestovného ruchu</i>	137	125,5	91,61 %

Wskaźniki (po 17 wniosku o płatność) *Ukazovatele (po 17. žiadosti o platbu)*

	Nazwa wskaźnika / <i>Názov ukazovateľa</i>	Wartość docelowa / <i>Cieľová hodnota</i>	Wartość osiągnięta od początku realizacji / <i>Hodnota dosiahnutá počas referenčného obdobia</i>	Stopień realizacji / <i>Stupeň realizácie</i>
1.5	Liczba „miękkich” działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza / <i>Počet „mäkkých” cezhraničných aktivít podporujúcich kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničného regiónu</i>	479	338	70,56 %
1.6	Liczba zmodernizowanych elementów obiektów dziedzictwa kulturowego po zakończeniu prac restauracyjnych i konserwatorskich / <i>Počet zmodernizovaných pamiatok kultúrneho dedičstva po reštaurátorských a konzervačných prácach</i>	64	41	64,06 %
1.9	Liczba organizacji uczestniczących w transgranicznych projektach na rzecz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego / <i>Počet organizácií zapojených do cezhraničných projektov súvisiacich s kultúrnym a prírodným dedičstvom</i>	204	173	84,80 %
1.12	Liczba nowych/zmodernizowanych transgranicznych e-produktów i e-usług / <i>Počet nových/zmodernizovaných cezhraničných e-produktov a e-služieb</i>	34	29	85,29 %



Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim / *Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko- slovenskom pohraničí*

Partner Wiodący : Związek Euroregion „Tatry”

Partner projektu 1: Samorządowy Kraj Preszowski

Partner projektu 2: Samorządowy Kraj Żyliński

Vedúci partner: Zväzok Euroregión „Tatry”

Partner projektu 1: Prešovský samosprávny kraj

Partner projektu 2: Žilinský samosprávny kraj

**Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu
polsko-słowackim /**
***Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-
slovenskom pohraničí***

Okres realizacji:
Obdobie realizácie:

17.02.2016 r. - 30.06.2022 r.

Wartość dofinansowania z EFRR:
*Hodnota finančného príspevku
z EFRR*

1 089 594,38 €


Wartość całkowita projektu:
Celková hodnota projektu:

1 281 875,87 €


Dodatkowe środki na realizację PP/ *Dodatočné finančné prostriedki na realizáciu SP*

Decyzją Nr 05/2020 z dn. 03.03.2020 r. Komitet Monitorujący zatwierdził dodatkowe środki na realizację PP w ramach 3. osi w wysokości 262 366,48 €./

Rozhodnutím č.05/2020 z dňa 3.3.2020 Monitorovací Výbor schválil dodatočné finančné prostriedky na realizáciu SP v rámci 3.prioritnej osi

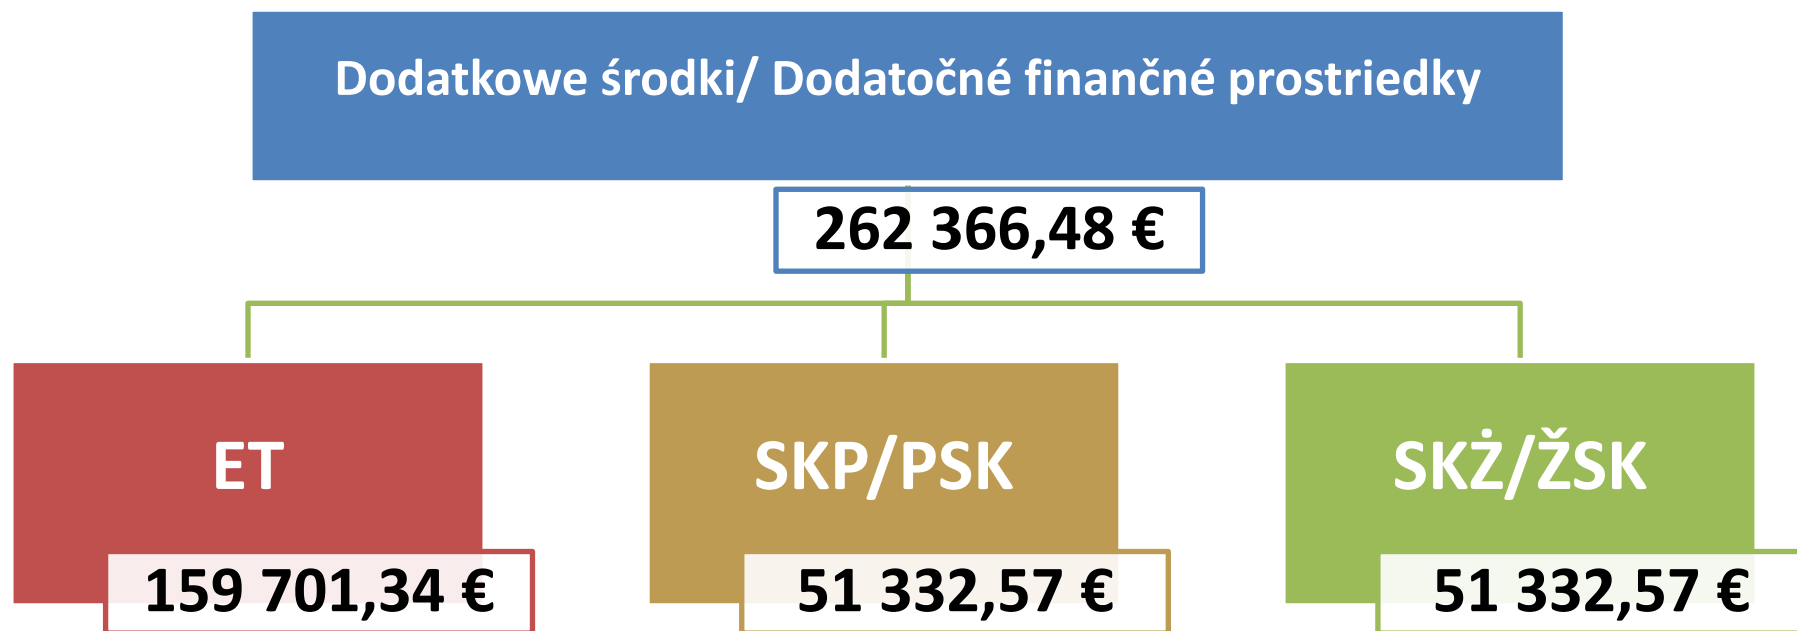

IV nabór wniosków (ET + SKP)/
IV. výzva na predkladanie žiadostí (ET+PSK)
15.06.2020 – 07.09.2020

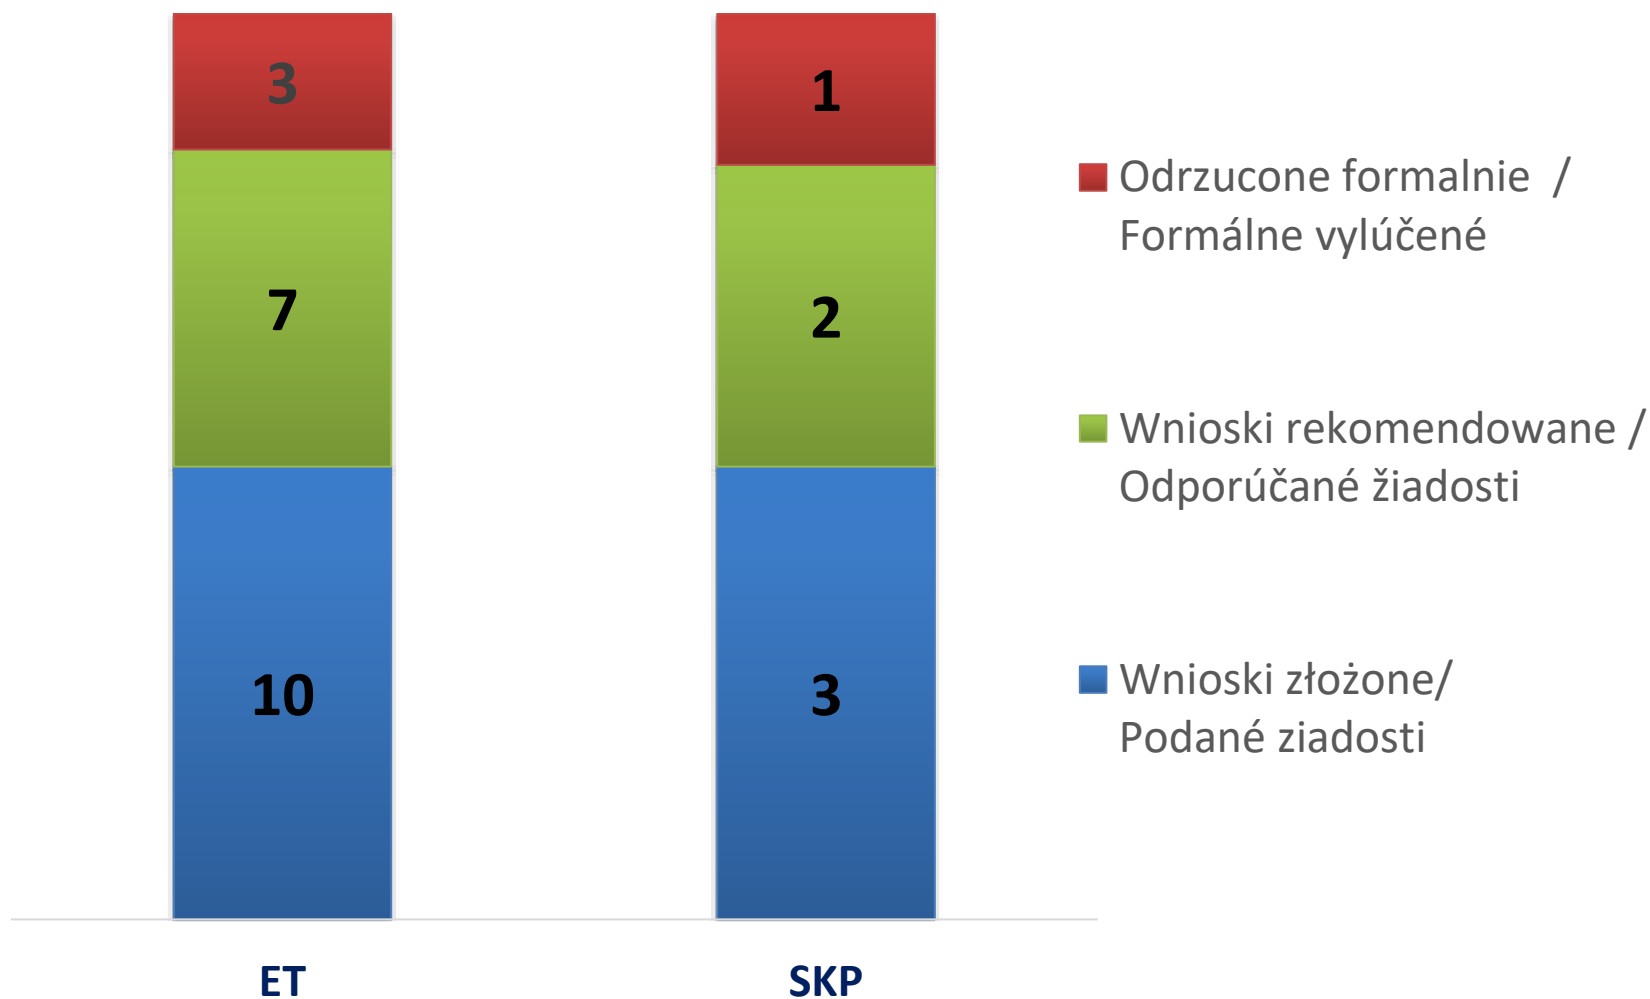

IV nabór wniosków (ET + SKP) / *IV. výzva na predkladanie žiadostí* (ET + PSK)

203 327,65 €

ET 154 566,76 €
SKP 48 760,89 €


Alokacja / Alokácia

Wnioskowane dofinansowanie
Žiadaný finančný príspevok

518 365,13 €

ET 409 660,39 €
SKP 108 704,74€

V nabór wniosków (SKŽ) /
V. výzva na predkladanie žiadostí (ŽSK)
09.09.2020 – 30.09.2020

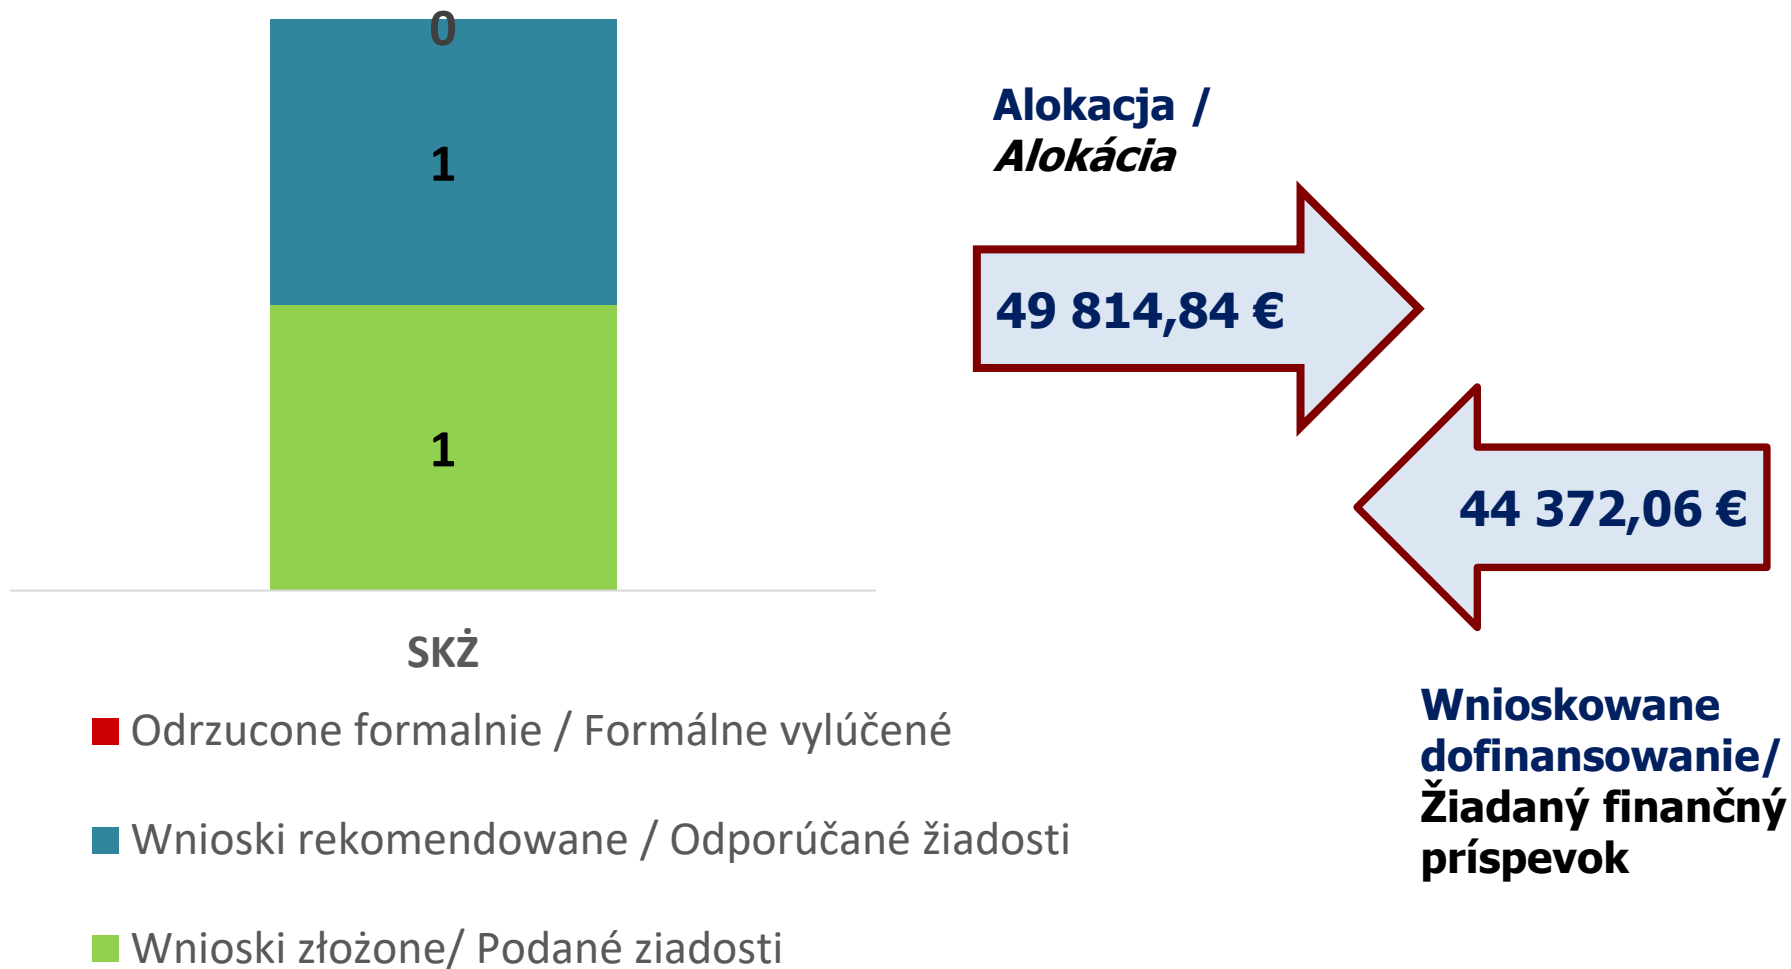

Wykorzystanie alokacji na realizację mikroprojektów/ *Využitie alokácie na realizáciu mikroprojektov*

Wartość
zakończonych
mikroprojektów po III
naborach /

*Hodnota zazmluvnených
mikroprojektov po III.
výzvach*

727 184,43 €

Wartość dostępnej alokacji
na mikroprojekty w
ramach PP /

*Hodnota dostupnej
alokácie na mikroprojekty
v rámci SP*

926 155,31€

78,52 %


356 929,02 €



Wartość
mikroprojektów
rekomendowana do
dofinansowania z IV
i V naboru

*Hodnota
mikroprojektov
odporúčanych na
spolufinancovanie z
IV. a V. výzvy*

Wykorzystanie alokacji na mikroprojekty/ *Využitie alokácie na mikroprojekty*

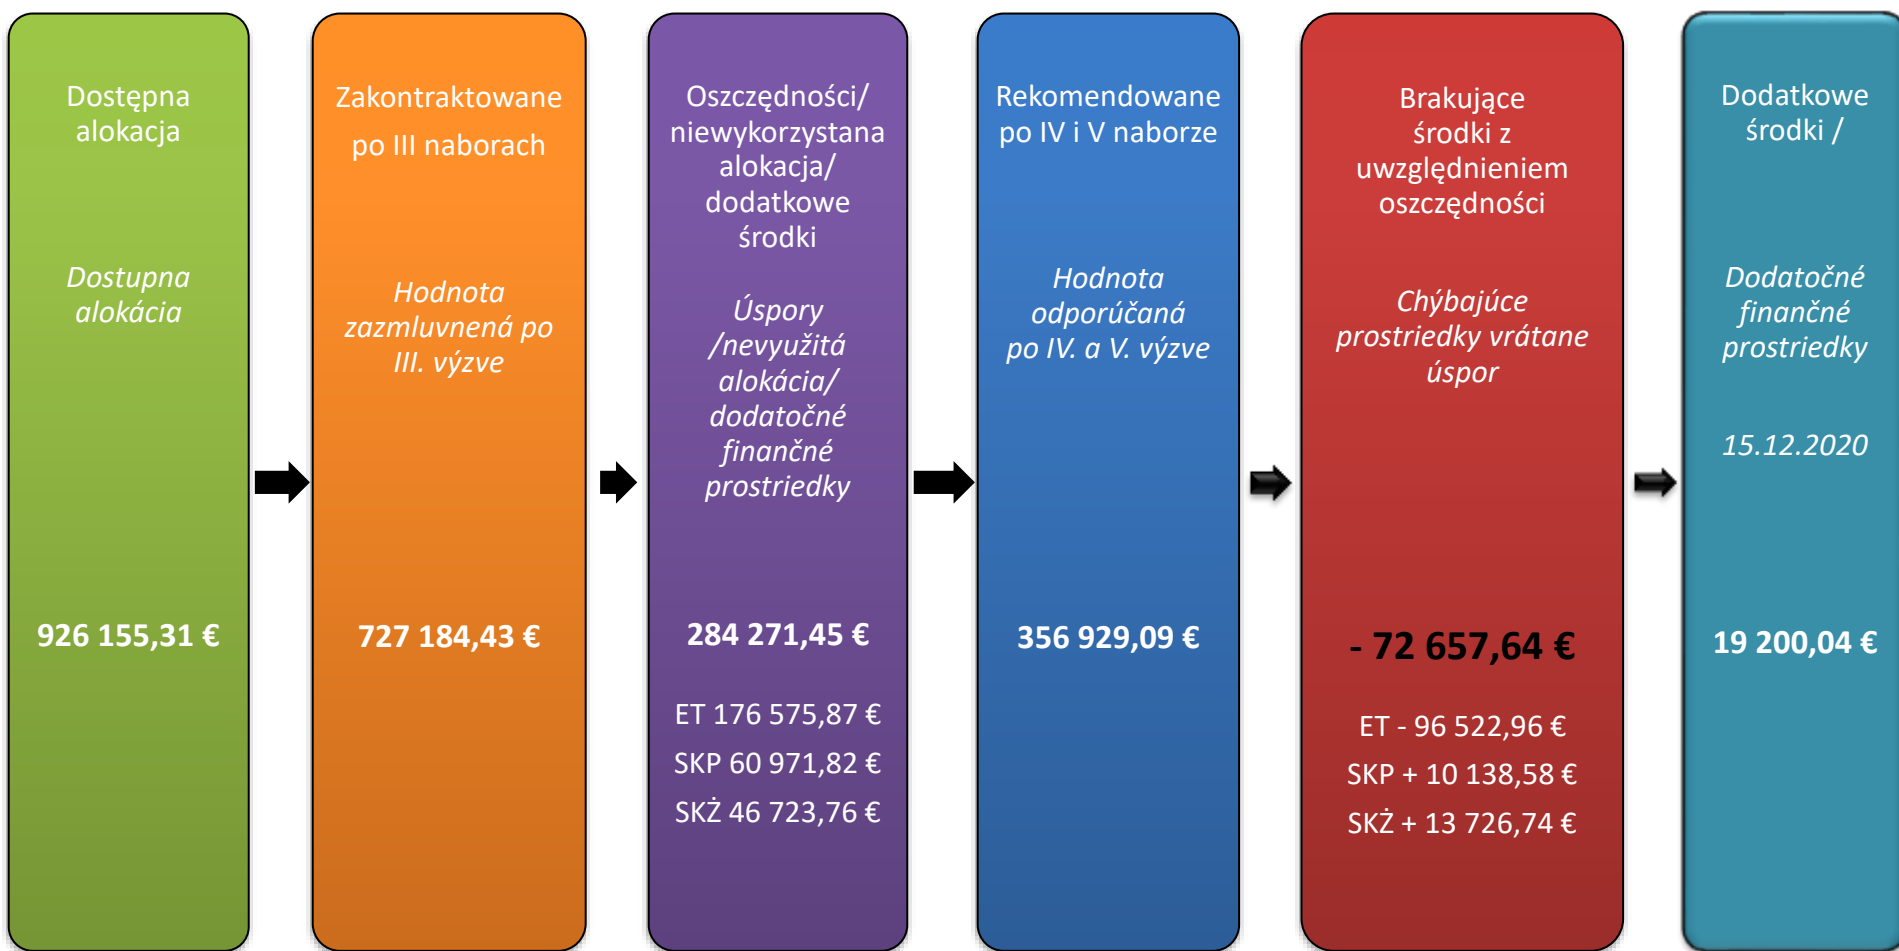

Wnioski o płatność

- 17 wniosek o płatność zostanie złożony do WST po zatwierdzeniu 17 częściowego wniosku ZET
- Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR:
420 326,87 €

Žiadosti o platbu

- *17. žiadost' o platbu bude podaná na STS v decembri 2020 po schválení 17. čiastkovej žiadosti o platbu ZET*
- *Celková hodnota žiadaného spolufinancovania z EFRR:*
420 326,87 €

Wskaźniki (po 17 wniosku o płatność)

Ukazovatele (po 17. žiadosti o platbu)



4.3



CO44

Nazwa wskaźnika / Názov ukazovatel'a	Wartość docelowa / Ciel'ová hodnota	Wartość osiągnięta od początku realizacji/ Hodnota dosiahnutá počas referenčného obdobia	Stopień realizacji/ Stupeň realizácie
Liczba wspólnych inicjatyw lokalnych na rzecz zatrudnienia i wspólnych szkoleń <i>Počet spoločných miestnych aktivít na podporu zamestnanosti a spoločných školení</i>	127	104	81,89%
Liczba uczestników wspólnych lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspólnych szkoleń <i>Počet účastníkov spoločných miestnych aktivít na podporu zamestnanosti a spoločných školení</i>	3662	2019	55,13%

Wpływ pandemii Covid-19 na realizację PP/ *Vplyv pandémie Covid-19 na realizáciu SP*

- wydłużanie terminu realizacji mikroprojektów z III naboru / *predĺženie termínu realizácie mikroprojektov z III. výzvy*;
- problemy z realizacją działań miękkich (zamknięcie granic, zamknięcie szkół, zakaz organizacji spotkań) / *problémy s realizáciou mäkkých aktivít (zatvorené hranice, zatváranie škôl, zákaz stretnutí)*;
- kwarantanna osób odpowiedzialnych za realizację mikroprojektów i PP/ *karanténa osób zodpovedných za implementáciu mikroprojektov a SP*);
- konieczność zapewnienia opieki nad dziećmi przez koordynatorów mikroprojektów i personel PP/ *potreba zabezpečenia starostlivosti o deti koordinátormi mikroprojektov a personálu SP*;
- ryzyko nieosiągnięcia wskaźników / *riziko nedosiahnutia ukazovateľov*.

Działania minimalizujące negatywne skutki pandemii Covid-19

/ Opatrenia minimalizujúce negatívne účinky pandémie Covid-19

- Komitet ds. mikroprojektów w dniu 10.06.2020 r. zatwierdził *Komunikat dla mikrobebeneficjentów realizujących mikroprojekty w związku z pandemią COVID-19* / Výbor pre mikroprojekty 10.6.2020 schválil *Oznámenie pre mikro-prijímateľov realizujúcich mikroprojekty v súvislosti s pandemiou COVID-19*
- bieżący monitoring stanu realizacji mikroprojektów / *priebežné monitorovanie stavu implementácie mikroprojektov*
- przyspieszenie procedury zatwierdzania wnioskowanych zmian w mikroprojektach (do 7 dni kalendarzowych) m.in.:
/ urýchlenie postupu schvaľovania žiadostí o zavedenie zmien v mikroprojektoch (do 7 kalendárnych dní) o.i.:
 - zmiana terminu realizacji mikroprojektu (do/ponad 18 mesiacov) / *zmena termínu realizácie mikroprojektu (do/ponad 18 mesiacov)*
 - kwalifikowalność wydatków / *oprávnenosť výdavkov*
 - zmiany merytoryczne w mikroprojektach/ *vecné zmeny v mikroprojektoch*

1 oś

Sukcesy i rezultaty realizacji mikroprojektów / *Úspechy a výsledky realizácie mikroprojektov*

Partner wiodący: / Vedúci partner: Gmina Czorsztyn

Partner mikroprojektu: Obecný úrad Červený Kláštor

Tytuł mikroprojektu: Budowa ścieżki rowerowo-pieszej w miejscowości Sromowce Niżne
Názov mikroprojektu: *Výstavba cestičky pre chodcov a cyklistov v obci Sromowce Nižne*

Okres realizacji: / Obdobie realizácie: 01-2020 - 11-2020

Wartość mikroprojektu: / Hodnota mikroprojektu: 69 991,92 €

Wartość dofinansowania z EFRR: / Hodnota finančného príspevku z EFRR: 49 995,22 €

- Budowa dwukierunkowej trasy pieszo-rowerowej o długości 563 m w miejscowości Sromowce Niżne/
Výstavba 563 m dlhej obojsmernej pešej a cyklistickej trasy v Sromowcach Nižnych



Źródło: <https://narowery.visitmalopolska.pl/>

- Trasa biegnie na lewym brzegu rzeki Dunajec od kładki rowerowo pieszej w stronę przystani flisackiej/
Trasa vedie po ľavom brehu rieky Dunajec od lávky pre chodcov smerom k prístavu plťí



Fot. Gmina Czorsztyn

W ramach projektu powstał także spot reklamowy promujący polsko-słowackie pogranicze (w zamian za planowany polsko-słowacki rajd rowerowy)/
V rámci projektu bol tiež vytvorený reklamný spot propagujúci poľsko-slovenské pohraničie (namiesto plánovaného poľsko-slovenského cyklistického podujatia)



Fot. Gmina Czorsztyn

3 oś

Sukcesy i rezultaty realizacji mikroprojektów/ Úspechy a výsledky realizácie mikroprojektov

Partner wiodący: / Vedúci partner: **Gmina Nowy Targ**

Partner mikroprojektu: **Obec Štrba**

Tytuł mikroprojektu: Transgraniczna wymiana dobrych praktyk w zakresie narciarstwa biegowego na pograniczu polsko- słowackim /
Názov mikroprojektu: Cezhraničná výmena dobrej praxe v bežeckom lyžovaní na poľsko-slovenskom pohraničí

Okres realizacji: / Obdobie realizácie: **05-2019 - 09-2020**

Wartość mikroprojektu / Hodnota mikroprojektu: **108 572,10 €**

Wartość dofinansowania z EFRR: / Hodnota finančného príspevku z EFRR: **92 286,28 €**



Fot. Gmina Nowy Targ

Projekt obejmował m.in. doszkadzanie kadry nauczycielsko-trenerskiej w zakresie przygotowywania tras oraz sprzetu narciarskiego/
Projekt okrem iného zahŕňal školenie pedagogického a trénerského personálu v príprave lyžiarskych tratí a lyžiarskeho vybavenia

Zrealizowano także 3 obozy
szkoleniowe na nartach
biegowych dla uczniów
szkół podstawowych/

*Pre žiakov základných škôl
boli pripravené aj 3
sústredenia na bežkách*



Fot. Gmina Nowy Targ



Interreg
Polska-Słowacja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



Dziękuję za uwagę!

Ďakujem za pozornosť!



Žilinský
samosprávny
kraj
